



COMUNE DI EBOLI

PROVINCIA DI SALERNO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' BOSCARIELLO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL COORDIN. PER LA SICUREZZA
ing. Marco GENOVESE

IL R.U.P. (UTC)

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Aggiornamenti:

Data:

OTTOBRE 2018


Scala:

N:

15

a termine delle vigenti leggi sui diritti d'autore, questo disegno non potrà essere realizzato, riprodotto o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	15/11/2018	16/11/2018	1
2	B	Preparazione cantiere	16/11/2018	21/11/2018	5
3	C.1	LAVORI EDILI Scavo per posa cavidotto e realizzazione pozzetti e nuovi plinti di fondazione e rimozione vecchi impianti	18/11/2018	26/02/2019	100
4	C.2	LAVORI ELETTRICI Stesura cavi e posa di nuovi pali di illuminazione e nuove armature	20/01/2019	01/04/2019	71
5	C.3	LAVORI ELETTRICI Collegamento armature e nuovi quadri di alimentazione	01/04/2019	11/04/2019	10
6	E	Pulizie e smobilizzo	11/04/2019	13/04/2019	2
7	F	Fine lavori	13/04/2019	14/04/2019	1

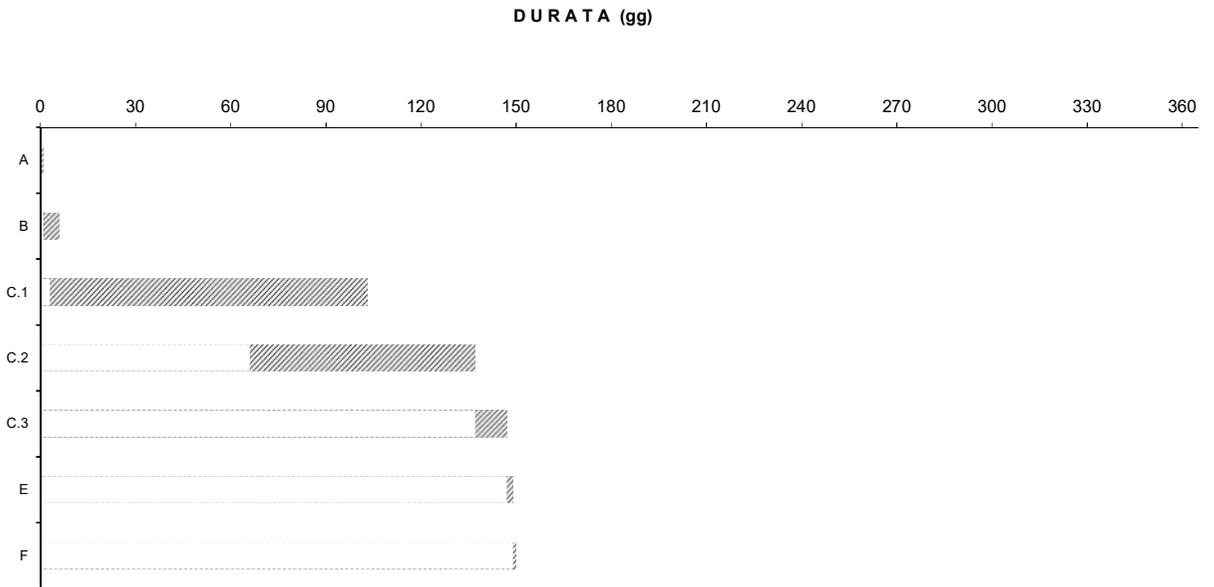

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

150 gg

TC

150 gg.

naturali consecutivi
